

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(01/31)



تقرير سير الأعمال لشهر (يناير) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 22م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / يناير)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

الفحص والتسليم

أعمال الخدمات

أعمال التأثيث

أعمال التشطيب

أعمال العظم

إصدار التراخيص

التعاقد مع المكتب الهندسي

التعاقد مع المقاول

ترسية المشروع

طلب عروض السعر

مراجعة التصميم

مراجعة المخططات

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال الألمنيوم

أعمال الأبواب

أعمال الدهانات الخارجية

أعمال الدهانات الداخلية

أعمال الأسقف

أعمال الحوائط

أعمال الأرضيات

أعمال العزل المائي والحاراري

أعمال الالباسة الخارجية

أعمال الالباسة الداخلية

يحدث الآن

- 01 أعمال السقفة الخرسانية للمدخلات.
- 02 الانتهاء من صب سقف الطابق الارضي لسكن الامام والمؤذن.
- 03 أعمال مباناني المسجد.
- 04 أعمال الطرشرة واكسسوارات الطابوق في المسجد.
- 05 الانتهاء من صب أعمدة الطابق الأول في الفل.

الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية




04



03



02

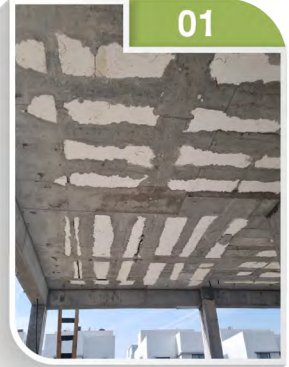

01

- 01 أعمال مباناني المسجد.
- 02 أعمال الالباسة في المسجد.
- 03 أعمال الدهانات الأولية في المسجد.
- 04 بداية أعمال الكهرباء والميكانيكا للمسجد.
- 05 أعمال السقفة المستعار في المسجد.

الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)




04



03



02

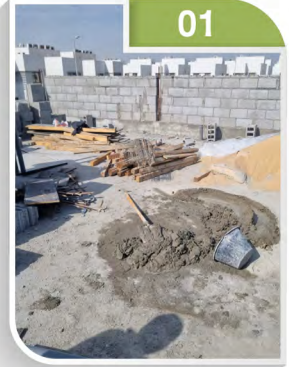

01



الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
