


مسجد الأتباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(07 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يوليو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

16 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 9 / 20م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يوليو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
-----------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------------

يحدث الآن

أعمال التشطيب


أعمال اللباسة الداخلية	أعمال اللباسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحاراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألمنيوم
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-----------------

يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن يحدث الآن

- الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية**
- 01 استكمال أعمال البلاط في أرضيات المناطق الرطبة في المسجد، وفي أرضيات الطابق الأول في الفلل.
 - 02 أعمال العزل المائي في اسطح الفلل (صب الخرسانة الرغوية)
 - 03 استكمال أعمال دهانات الأسقف المستعارة في المسجد.
 - 04 أعمال تركيب الإنارات السقفية في مصلى الرجال.
 - 05 أعمال دفن الرمل النظيف في الموقع العام.



- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)**
- 01 استكمال وتسليم أعمال البلاط في المناطق الرطبة في المسجد، وفي الفلل.
 - 02 استكمال أعمال العزل المائي في اسطح الفلل.
 - 03 استكمال أعمال تشطيب داخل المسجد، (تركيب الأبواب والإنارات والديكورات).
 - 04 استكمال أعمال دفن الرمل النظيف في الموقع العام لبدء التشطيب.

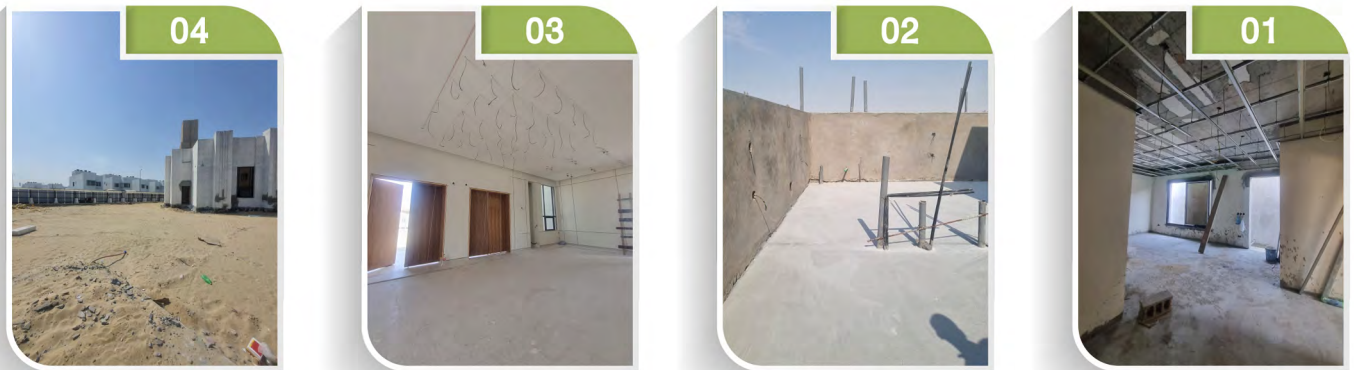

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
