

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(06 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يونيو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 22م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يونيو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميم مراجعة السعر طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال اللباسة الداخلية أعمال اللباسة الخارجية أعمال الدهانات الداخلية أعمال الدهانات الخارجية أعمال العزل المائي والحاراري أعمال الأرضيات أعمال الحوائط أعمال الأسقف الأبواب الأعمال الألمنيوم


يحدث الآن

يحدث الآن


يحدث الآن

يحدث الآن

- الأعمال التي تم الإنهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية
- 01 استكمال أعمال البلاط في المناطق الرطبة في المسجد.
 - 02 استكمال تركيب الأسقف المستعارة في المسجد.
 - 03 انتهاء أعمال اللياسة في الوارش الداخلي وبيت الدرج في الفل.
 - 04 الانتهاء من لياسة واجهات الفل.

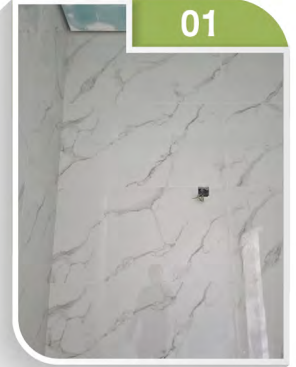

- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)
- 01 استكمال وتسليم أعمال البلاط في المناطق الرطبة في المسجد.
 - 02 أعمال العزل المائي في اسطح الفل.
 - 03 أعمال دهانات الأسقف المستعارة في المسجد.
 - 04 البدء بأعمال تركيب هيكل الأسقف المستعارة في الفل.

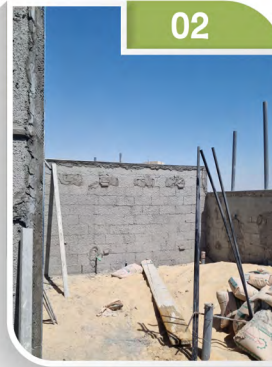

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
