

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(05 / 31)



تقرير سير الأعمال لشهر (مايو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 22م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / مايو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال اللباسة الداخلية أعمال اللباسة الخارجية أعمال الدهانات الداخلية أعمال الدهانات الخارجية أعمال المائي والعزل والحاراري الأرضيات الحوائط الأسقف الأبواب الأعمال الألنيوم

يحدث الآن



يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن



الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 31 يوم الماضية

- 01 أعمال عزل البوليوريثان في سطح المسجد.
- 02 صب خرسانة عمدة وطبانة سور الفلل.
- 03 البدء بتركيب الأسقف المستعارة في المسجد.
- 04 الانتهاء من تركيب بلاط ارضيات مطلى الرجال ومطلى النساء.
- 05 توريد وتركيب النوافذ في مطليات المسجد.

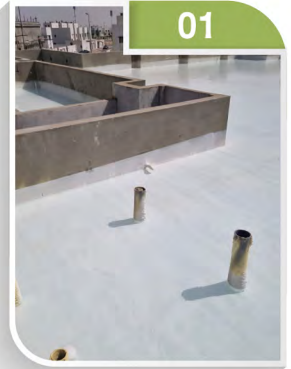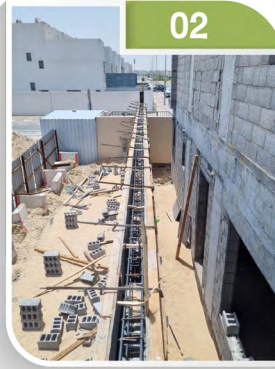

الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)

- 01 انتهاء أعمال البلاط في المناطق الرطبة في المسجد.
- 02 استكمال تركيب الأسقف المستعارة في المسجد.
- 03 البدء بأعمال تركيب الإنارات وتمديد الأسلاك الكهربائية في المسجد.
- 04 البدء بأعمال الدهانات الأولية داخلي في الفلل.
- 05 الانتهاء من لياسة واجهات الفلل.

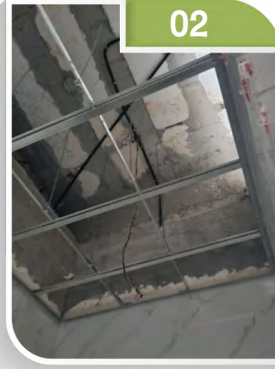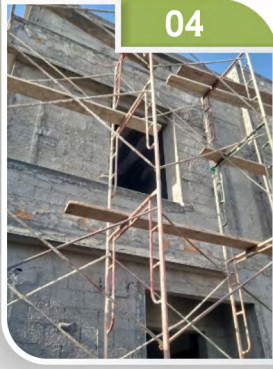

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
