

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(08 / 31)



تقرير سير الأعمال لشهر (أغسطس) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

16 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 9 / 20م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / أغسطس)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

الفحص
والترسيم

أعمال
الخدمات

أعمال
التأثيث

أعمال
التشطيب

أعمال
العظم

إصدار
التراخيص

التعاقد مع
المكتب
الهندسي

التعاقد مع
المقاول

ترسية
المشروع

طلب
عروض
السعر

مراجعة
التصاميم

مراجعة
المخططات

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال
الألومنيوم

أعمال
الأبواب

أعمال
الأسقف

أعمال
الحوائط

أعمال
الأرضيات

أعمال
العزل
المائي
والحراري

أعمال
الدهانات
الخارجية

أعمال
الدهانات
الداخلية

أعمال
اللياسة
الخارجية

أعمال
اللياسة
الداخلية

يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن


يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن

**الأعمال التي تم
الإنهاء منها
خلال الـ 31 يوم
الماضية**

- 01 استكمال أعمال تركيب الأبواب في المسجد وداخل الفلل.
- 02 رش البولي يوريثان وعمل طبقة الأكريليك في اسطح الفلل.
- 03 استكمال أعمال تشطيب داخل المسجد، (تركيب والإنارات والديكورات في المحراب).
- 04 البدء بأعمال تركيب الأسقف المستعارة في الفلل.
- 05 أعمال توريد وتركيب المكيفات الدوالية في المسجد.

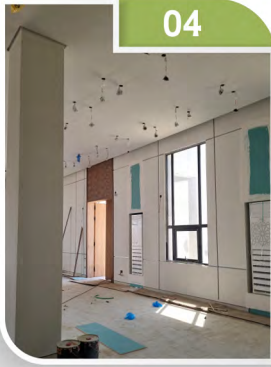


04



03



02

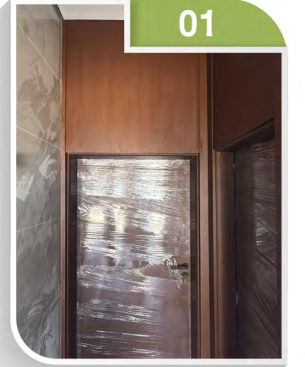

01

**الأعمال الجاري
تنفيذها خلال
الشهر الحالي
(الـ 30 يوم القادمة)**

- 01 استكمال أعمال تركيب الجسم بورد في الفلل والدهان فيها.
- 02 استكمال أعمال الدهانات الداخلية داخل المسجد.
- 03 استكمال أعمال دفان الموقع العام وصب المداخل.
- 04 استكمال أعمال تركيب الأبواب في الفلل.
- 05 توريد وتركيب خزانات المياه الرمادية ومياه التغذية للمسجد.




04



03



02

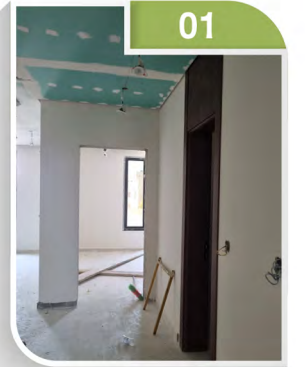

01



الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
