

مسجد الأتباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(04 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (أبريل) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م ²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م ²	عدد دروات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 22م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 28م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / أبريل)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى المسجد ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
-----------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	---------------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------------

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال الالباسة الداخلية	أعمال الالباسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحاراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألتنيوم
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-----------------

يحدث الآن


يحدث الآن

يحدث الآن


يحدث الآن

- 01 أعمال الالباسة وتعديلات الالباسة الداخلية في المسجد.
- 02 أعمال تركيب حديد الأسقف المستعارة في المسجد.
- 03 الانتهاء من لياسة المأذنة الخارجية مع البروفایل.
- 04 أعمال الالباسة الداخلية لمباني الفلل في الطابق الأرضي.
- 05 صب أعمدة وسقف بيت الدرج في الفلل.
- 06 صب خرسانات قواعد وميدات مداخل المسجد.
- 07 صب خرسانات القواعد والميدات لسور الفلل.
- 08 أعمال عزل أرضيات المناطق الرطبة في المسجد.


**الأعمال التي تم
الإنهاء منها
خلال الـ 31 يوم
الماضية**

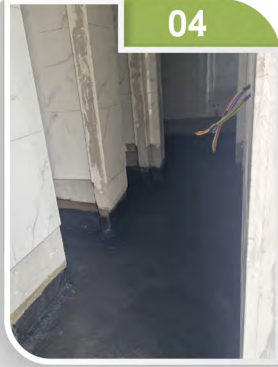

04

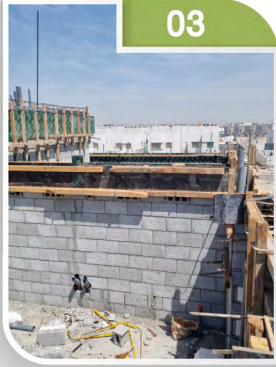

03

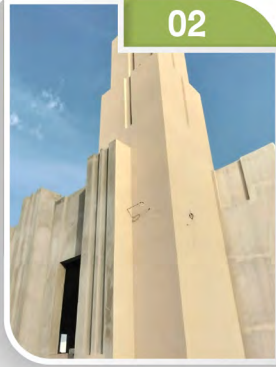

02



01

- 01 أعمال الدهانات الأولية في المسجد.
- 02 أعمال العزل في سطح المسجد.
- 03 انتهاء أعمال البلاط في المناطق الرطبة في المسجد.
- 04 البدء بتركيب الأسقف المستعارة في المسجد.
- 05 الانتهاء من تركيب بلاط أرضيات المسجد.
- 06 الانتهاء من أعمال تمديدات الاكتروميكانيكا الأولية في الطابق الأول في الفلل.
- 07 الانتهاء من أعمال الالباسة الداخلية في الطابق الأول في الفلل.
- 08 الانتهاء من أعمال دفن سور الفلل والموقع العام.


**الأعمال الجاري
تنفيذها خلال
الشهر الحالي
(الـ 30 يوم القادمة)**




04



03

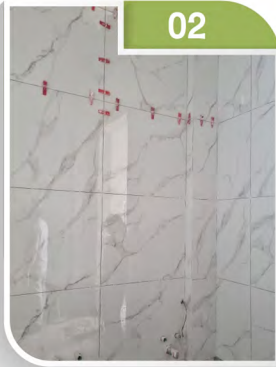

02

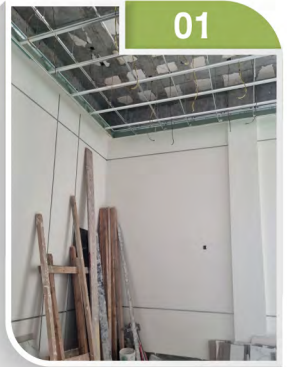

01



الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
