يعمر
جمعية يعمر للعناية بالمساجد
Yaamur Association for Mosque Care

مشروع

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

تقرير سير الأعمال لشهر (سبتمبر) لعام (2026م)

نسبة الإنجاز حتى تاريخ (30 / 09)



إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م²	عدد دورات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

تاريخ بداية المشروع
28 / 6 / 2025م

تاريخ نهاية المشروع النظامية
30 / 9 / 2026م

المدة الإضافية النظامية
33 يوماً

تاريخ نهاية المشروع المتوقعة
10 / 11 / 2026م

مدة المشروع
14 شهراً

المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / سبتمبر)

يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر

مكونات المشروع



- مبنى المسجد ومرافقه
- سكن للإمام
- سكن للمؤذن
- مرافق خضراء
- مواقف سيارات
- محلات تجارية وقفية

Yaamurorg

مؤشر انجاز بنود الأعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصاميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
								يحدث الآن			

أعمال التشطيب

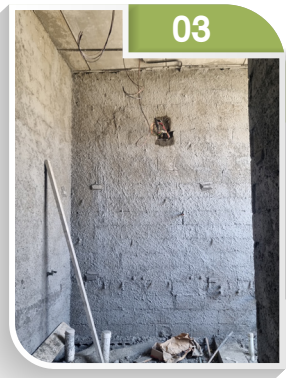
أعمال اللياسة الداخلية	أعمال اللياسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألمنيوم
		يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن

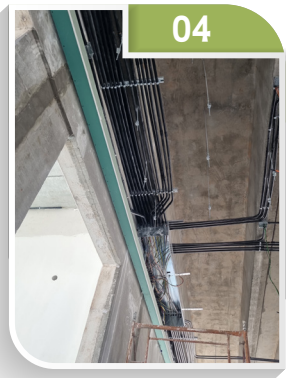
الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية

01 استكمال أعمال تركيب الجبسمبورد في الفلل والدهان فيها.
02 استكمال أعمال الدهانات الداخلية داخل المسجد.
03 استكمال أعمال دفان الموقع العام وبدء تركيب البلدورات والإنترلوك.
04 أعمال تركيب رخام الدرج والبدء بتركيب الترابزين للدرج في الفلل.
05 توريد وتركيب خزانات المياه الرمادية ومياه التغذية مع التمديدات الخاصة بالصرف للمسجد.

01


02


03


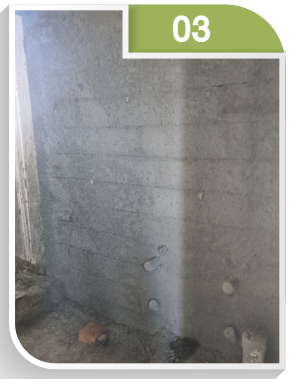
04


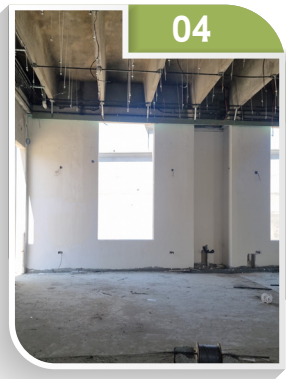
الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)

01 استكمال أعمال تركيب الجبسمبورد في الفلل والدهان فيها.
02 استكمال أعمال الدهانات الداخلية داخل المسجد.
03 استكمال أعمال دفان الموقع العام مع تركيب البلدورات والإنترلوك.
04 استكمال أعمال تركيب الأبواب في مع اكسسواراتها في المسجد والفلل.
05 استكمال أعمال تمديدات السباكة والكهرباء الخارجية في المسجد والفلل.

01


02


03


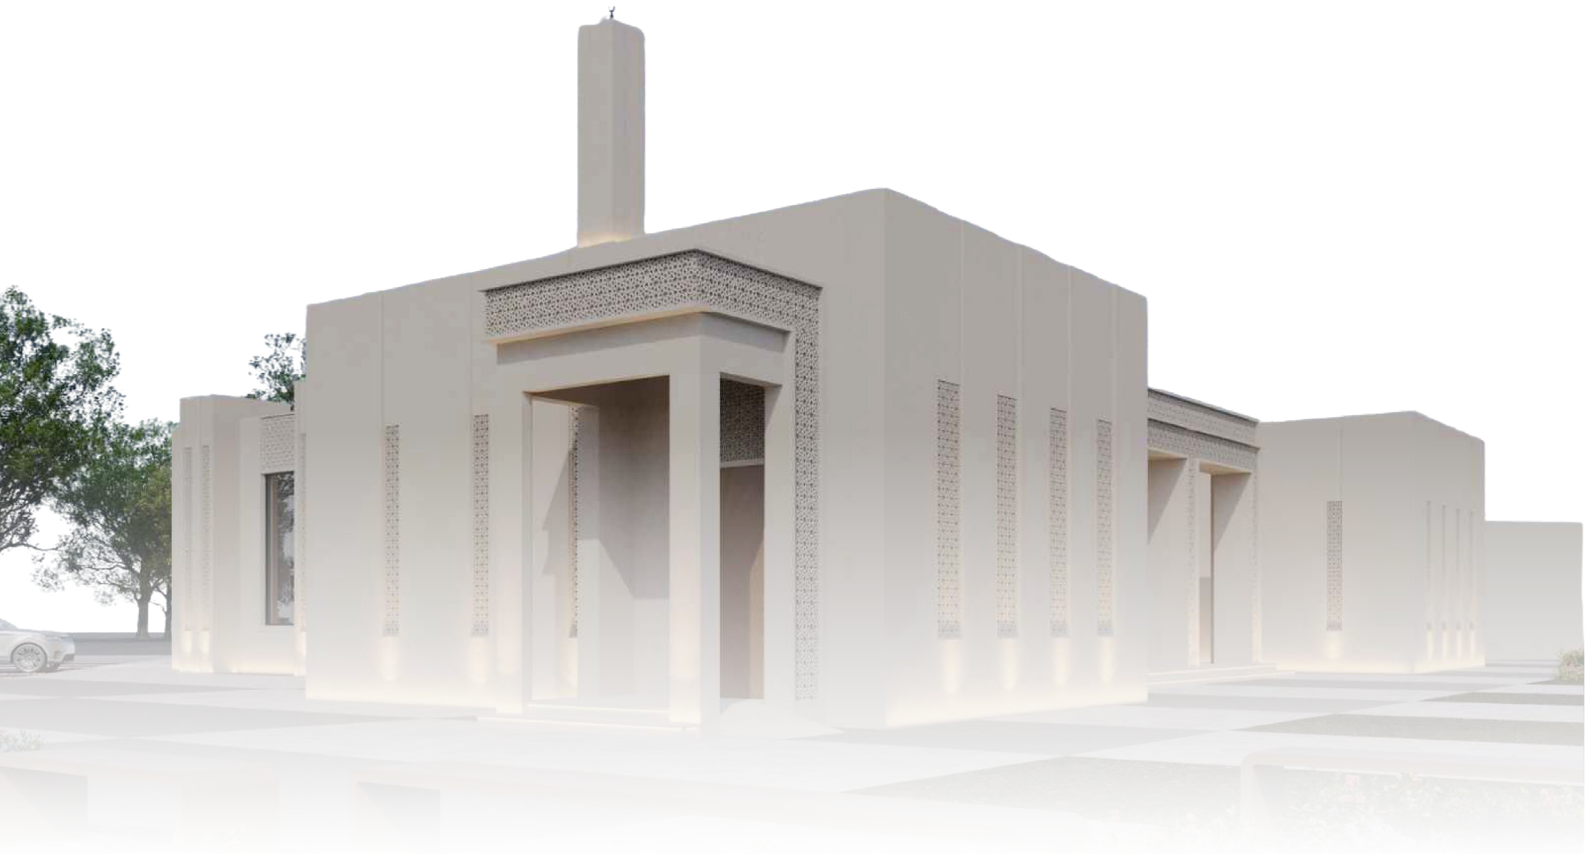
04


رابط البث المباشر للمشروع
اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع

تنـــويـــــــه

- تم منح المقاول مدة إضافية بالمشروع بناءً على وجود أعمال إضافية: المواضئ الخارجية / نظام المياه الرمادية / أعمال تصنيع المنارة.
- سيتم فرض غرامة تأخير على المقاول ابتداءً من تاريخ نهاية المشروع النظامية.



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع
