يعمر
جمعية يعمر للعناية بالمساجد
Yaamur Association for Mosque Care

مشروع

مسجد الأطباء

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

تقرير سير الأعمال لشهر (أكتوبر) لعام (2026م)

نسبة الإنجاز حتى تاريخ (10 / 31)



إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	3776.6 م²	عدد المواقف	31
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	908.00 م²	عدد دورات المياه	6
إجمالي عدد المصلين التقريبي	390.00	عدد المحلات الوقفية	2

- تاريخ بداية المشروع: 28 / 6 / 2025م
- تاريخ نهاية المشروع النظامية: 30 / 9 / 2026م
- المدة الإضافية النظامية: 33 يوماً
- تاريخ نهاية المشروع المتوقعة: 10 / 12 / 2026م
- مدة المشروع: 15 شهراً

المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / أكتوبر)



مكونات المشروع



- مبنى المسجد ومرافقه
- سكن للإمام
- سكن للمؤذن
- مرافق خضراء
- مواقف سيارات
- محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الأعمال

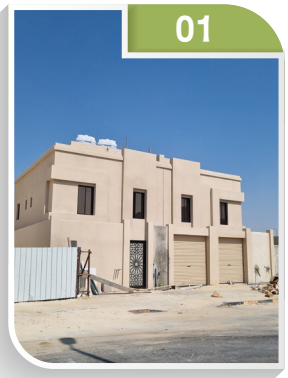
مراجعة المخططات	مراجعة التصاميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
								يحدث الآن			

أعمال التشطيب

أعمال اللياسة الداخلية	أعمال اللياسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألمنيوم
							يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن

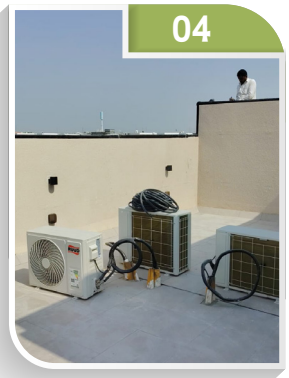
الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 31 يوم الماضية

01 أعمال الدهانات الخارجية في المسجد والمحلات والفلل.
02 استكمال أعمال دفان الموقع العام مع تركيب البلدورات والإنترلوك.
03 استكمال أعمال الدهانات الداخلية في المسجد والفلل.
04 استكمال أعمال تمديدات السباكة والكهرباء الخارجية في المسجد والفلل.
05 أعمال الأسفلت في الموقع العام.


01


02


03

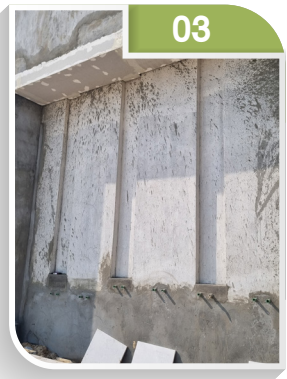

04

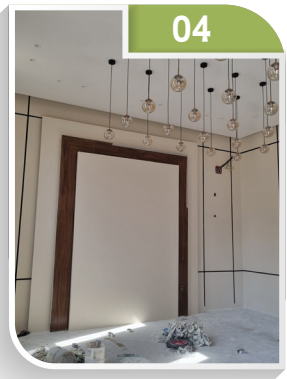
الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)

01 الانتهاء من أعمال الإنترلوك والبلدورات في الموقع العام.
02 الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية في مباني المشروع.
03 الانتهاء من أعمال بلاط المناطق الرطبة في المسجد والفلل.
04 الانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتشطيبات المسجد والفلل.


01


02


03


04

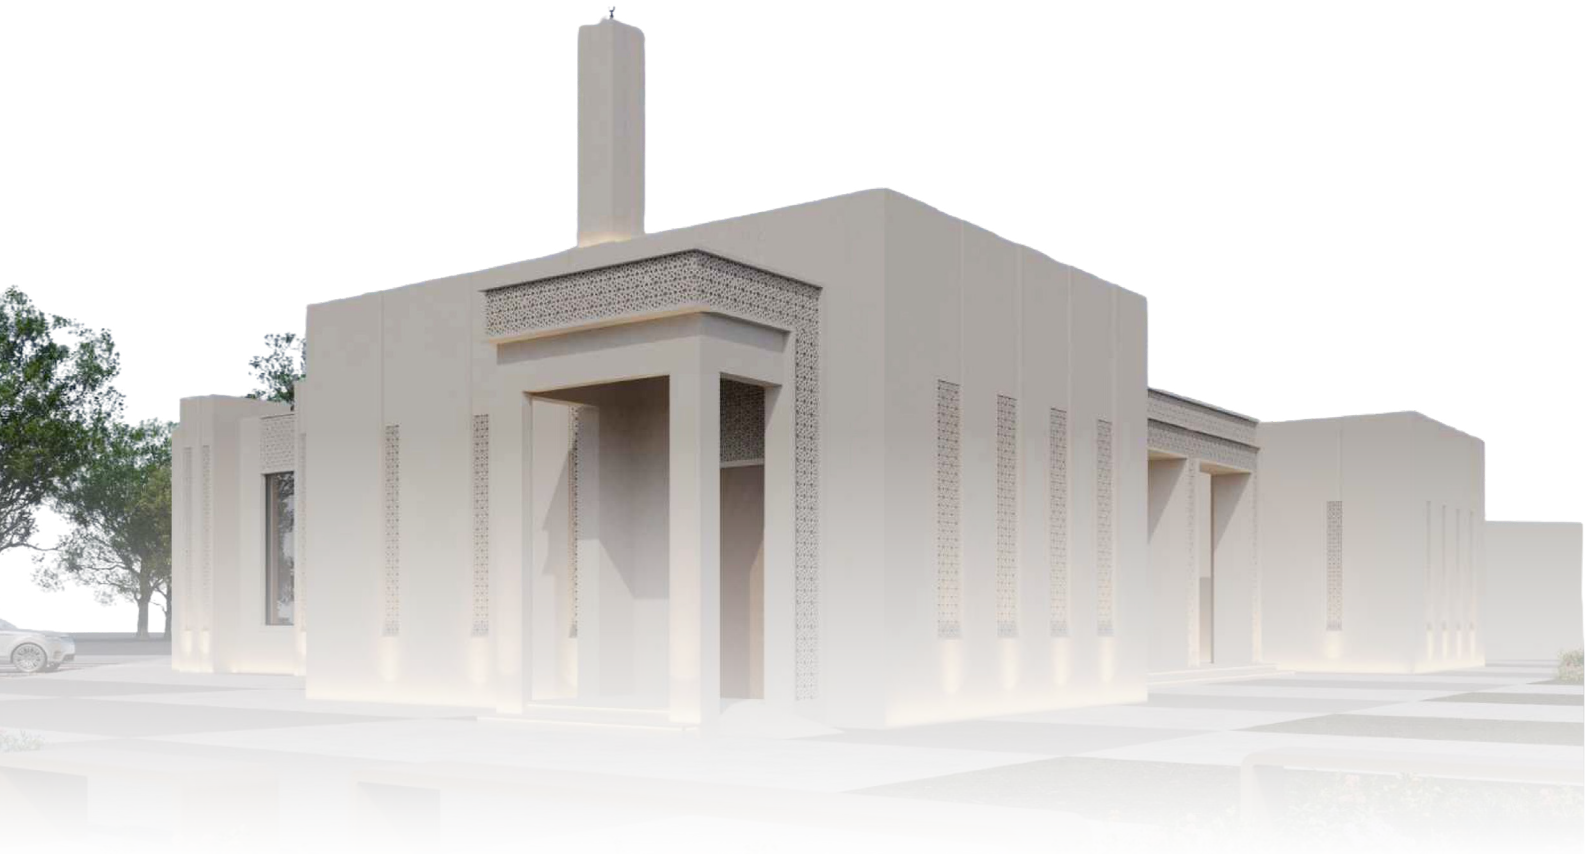
رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع

تنـــويـــــــه

- تم منح المقاول مدة إضافية بالمشروع بناءً على وجود أعمال إضافية: المواضئ الخارجية / نظام المياه الرمادية / أعمال تصنيع المنارة.
- سيتم فرض غرامة تأخير على المقاول ابتداءً من تاريخ نهاية المشروع النظامية.



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع
